



**Estrategia de
Salud Digital**

Conecta con tu salud

Seguimiento de la Estrategia de Salud Digital

Secretaría General de Salud Digital,
Información e Innovación del Sistema
Nacional de Salud

MARZO 2025



1 SEGUIMIENTO PROGRAMAS SALUD DIGITAL 2021-2026

2 NUEVOS PROGRAMAS DE SALUD DIGITAL 2024-2029

3 RIESGOS DE EJECUCIÓN

4 ANEXOS

01

**Estrategia de Salud
Digital 2021 - 2026**

1. Estrategia de Salud Digital

Principales programas en marcha

Dentro de la **Estrategia Nacional de Salud Digital** actualmente se están impulsando **SEIS Planes de acción (893M€)** para el SNS:

Plan de Servicios Digitales del SNS	Sostenibilidad, Mejora de la eficiencia y acceso equitativo del SNS	Transformación Digital de Atención Primaria y Comunitaria	Atención Digital Personalizada	Genómica SiGenEs	Espacio de Datos de Salud (SEDIA)
 170M € - Fondos MRR C.11.I.2	 220M € . PGE convenio Farmalindustria.	 230M € - Fondos MRR C11.I.3. PERTE	 130M € - Adenda MRR C11.I.3 16M € UNICAS MRR C18.I.4. PERTE	 27M € Adenda Fondos MRR C18.I.5 PERTE	 100M € - Fondos MRR C18.I.6 PERTE
 Hasta diciembre 2025	 Hasta diciembre de 2025 (prorrogado)	 Hasta junio de 2026	 Hasta junio de 2026	 Hasta junio de 2026	 Hasta diciembre de 2025
 197 proyectos	 187 proyectos	 158 proyectos	 70 proyectos	 18 proyectos	 2 casos de uso

Estos programas se encuadran en las siguientes **áreas de intervención** de la **Estrategia de Salud Digital**:



SERVICIOS DIGITALES DEL SNS: A1, A5, A6, A7, A8 y A10 y áreas transversales ESD

Plan de Sostenibilidad, MEJORA EFICIENCIA Y ACCESO EQUITATIVO SNS: A3, A4

TRANSFORMACIÓN DIGITAL AP: A2, A3, A4

ATENCIÓN PERSONALIZADA: A3, A5

GENÓMICA: A3, A5

CREACIÓN ESPACIO DE DATOS DE SALUD: A9

1. Plan de Servicios Digitales del SNS

Objetivos de los servicios de interoperabilidad del SNS

**ASEGURAR EL
FUNCIONAMIENTO Y LA
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE INTEROPERABILIDAD
CLÍNICA DEL SNS**



○ BD Poblacional completa

- **Tarjeta Sanitaria Virtual interoperable:** Real Decreto 922/2024. Plazo de adaptación especificaciones técnicas SNS (marzo 2026). **Nuevos campos:** Plazo para inclusión por las CCAA hasta diciembre 2025.
- **Incorporación mutualistas privados:** ISFAS completado → 491.000 personas (oct24), MUGEJU próxima carga
- **Actualización mutualistas privados:** Indicador cumplimiento Plan de Sostenibilidad → hasta dic/2025. **7 CCAA en producción, dos disponibles para puesta a producción.**

○ HCDSNS

- Del 2022 al 2024: triplicado uso por ciudadanos, muy por encima del uso de los profesionales.
- **Georreferenciación:** Identificación centros sanitarios con servicio de HCDSNS disponible. **Faltan 4 CCAA**
- **Encuestas certificados de centros y profesionales 2024.** **3 CCAA con problemas certificados para profesionales**
- **Incremento** de cobertura informes CMDIC del **50%** (dic/2022) al **69%** en diciembre de 2024.
- **CMDIC:** En valoración informe genética (SiGenES, UNICAS). Informe vacunas en proceso
- **Servicios de emergencia** sin acceso a HCDNS.



**REFORZAR LA CALIDAD, LA
CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y
LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN SUS DESPLAZAMIENTOS**




**ANALIZAR DEMANDA/OFERTA
RRHH SNS (REPS)**

- **Solicitud Baleares nuevo GT con las CCAA** para la definición de la **explotación** de datos de **REPS** → Mejora de la calidad del dato → **Convocatoria en MARZO primera sesión.**

2. Plan de Sostenibilidad, mejora de la eficiencia y acceso equitativo al SNS

Total de proyectos del programa.

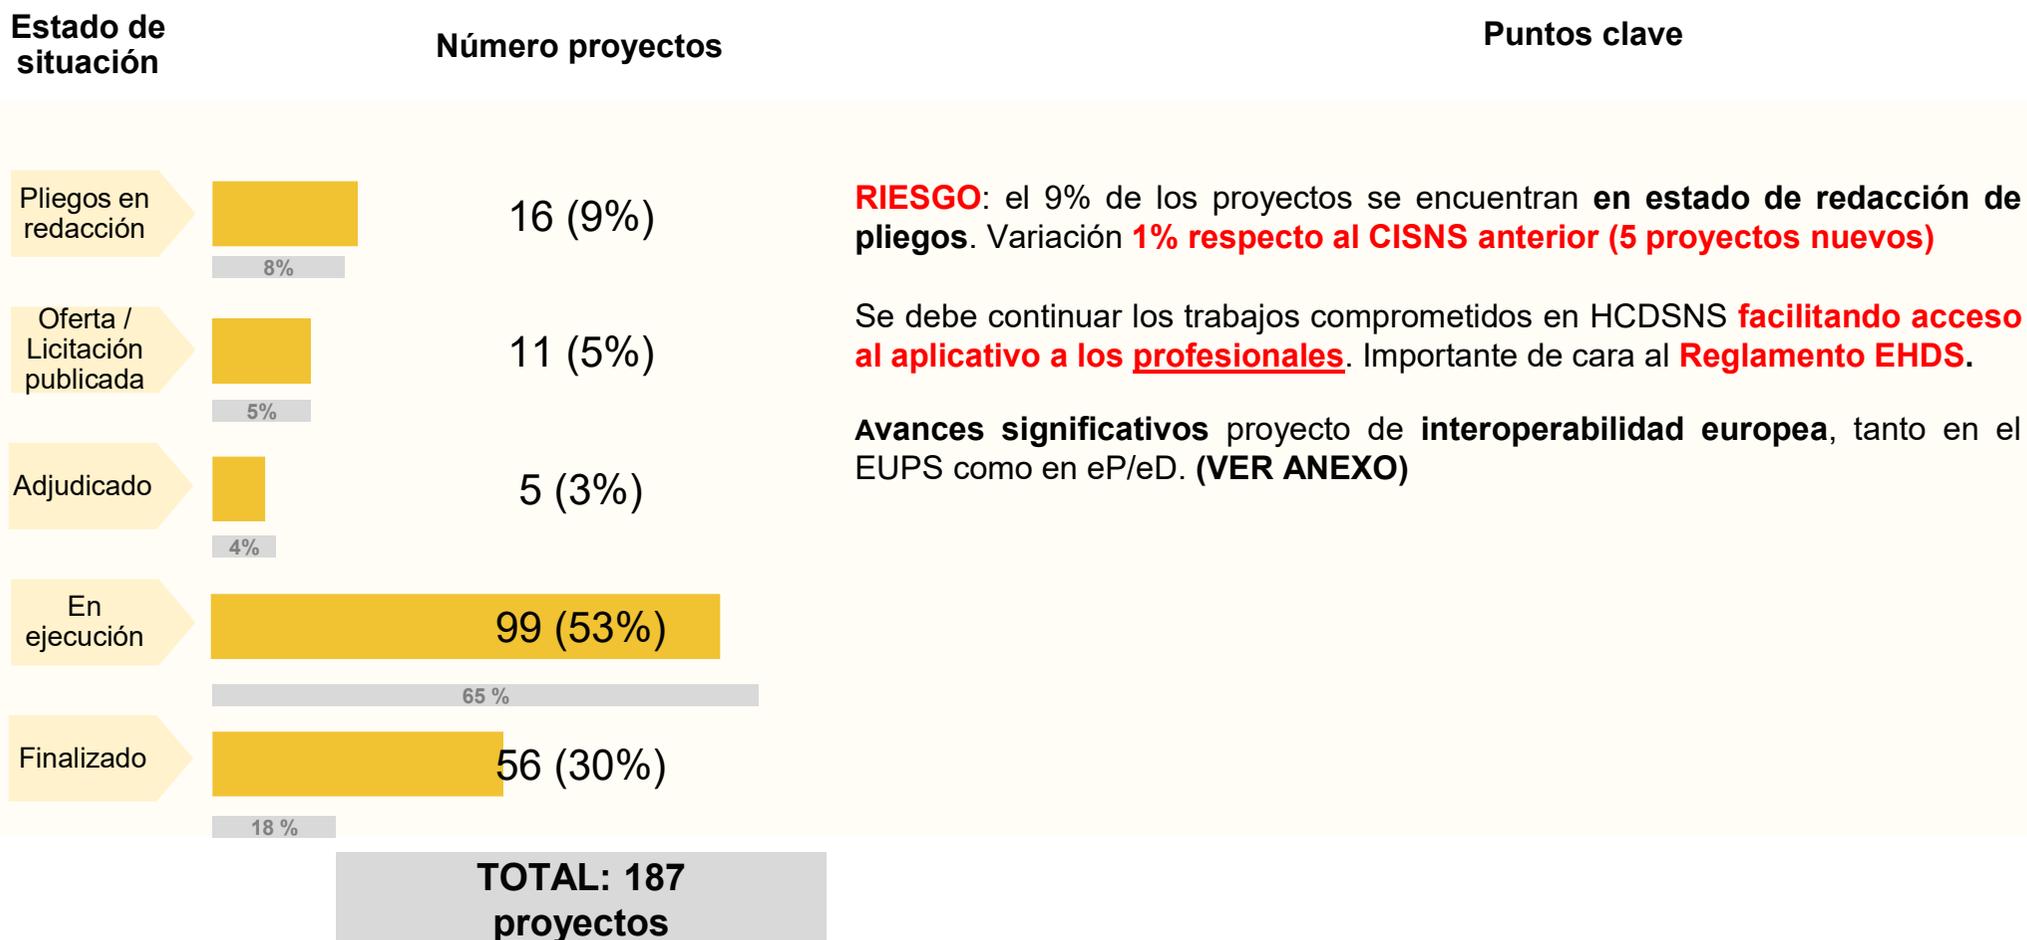

2. Plan de Sostenibilidad, mejora de la eficiencia y acceso equitativo al SNS

Ejecución presupuestaria por macroproyecto

Datos actualizados a 07/03/2025



Estado de situación de los presupuestos

189,5 millones de euros € (86%) ya han sido **licitados**, de los cuales:

- **Más de 153 millones de € (70%)** están **adjudicados**
- **Más de 36 millones de € (16%)** están **en licitación**

30,5 millones de € (14%) están **disponibles***

Situación del último CISNS (Diciembre 2024)



Presupuesto total programa

220.000.000 €

2. SIVAIN

Estado de licitaciones necesarias



15% en redacción



12% en licitación




73% en ejecución



Más de **9 M €** adjudicados
de **16 M €**

Estado de los hitos de integración técnica

Situación de la integración de las CC.AA.

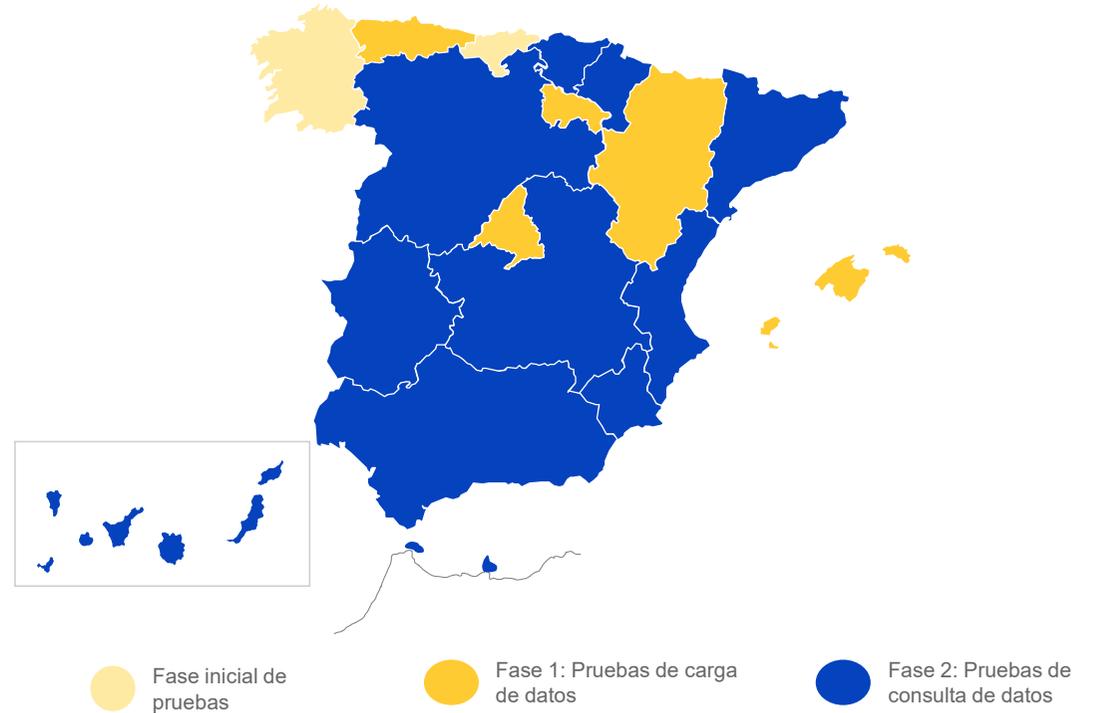

Comparativa último CISNS

Avance a fase de **carga de datos**: Baleares.


Avance a fase de **consulta de datos**: Castilla-La Mancha.

Datos actualizados a 07/03/2025.

3. Plan de Transformación Digital de Atención Primaria

Ejecución presupuestaria por grupos de trabajo

Datos actualizados a 07/03/2025

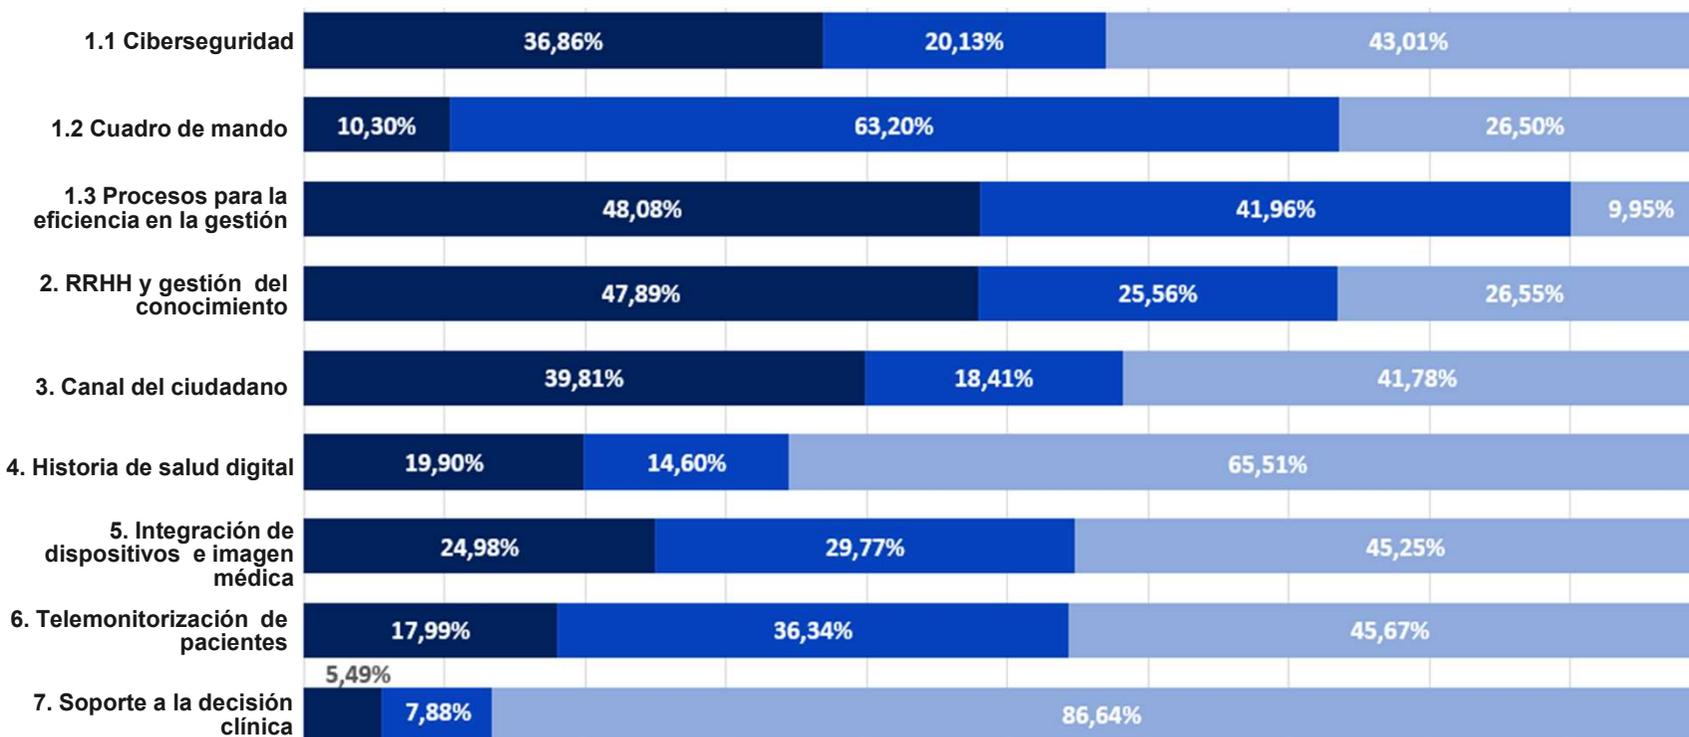

Situación del último CISNS (Diciembre 2024)

■ Adjudicado ■ En licitación ■ Disponible*

Porcentajes totales	29,9%	22,4%	47,7%
Presupuestos totales	68.717.576,53 €	51.479.767,21 €	109.802.655,92 €
	19 %	14 %	67 %

Estado de situación de los presupuestos

Más de 120 millones € (52,3%) han sido **licitados**, de los cuales:

- Casi 69 millones € (29,9%) están **adjudicados**
- Más de 51 millones € (22,4%) están **en licitación**

109 millones € (47,7%) están **disponibles**

Presupuesto total programa

230 millones de euros €

3. Plan de Transformación Digital de Atención Primaria

Colaboración y esfuerzo conjunto.

Gracias al **esfuerzo** conjunto y a la **implicación, dedicación y compromiso** de **CCAA** y **Ministerio de Sanidad** se han logrado **alcanzar**, con **éxito**, todos los **objetivos** iniciales definidos.



Sesiones y reuniones celebradas

+800



Correos intercambiados durante período

+9.000



Número de documentos generados

+2.350



Número de personas implicadas


+400



4. Plan de Atención Digital Personalizada

Situación actual del programa de ADP *Para poder licitar, es necesario que el subproyecto COFFEE se encuentre en estado REVISADO

*Última fecha de actualización 08/01/2025

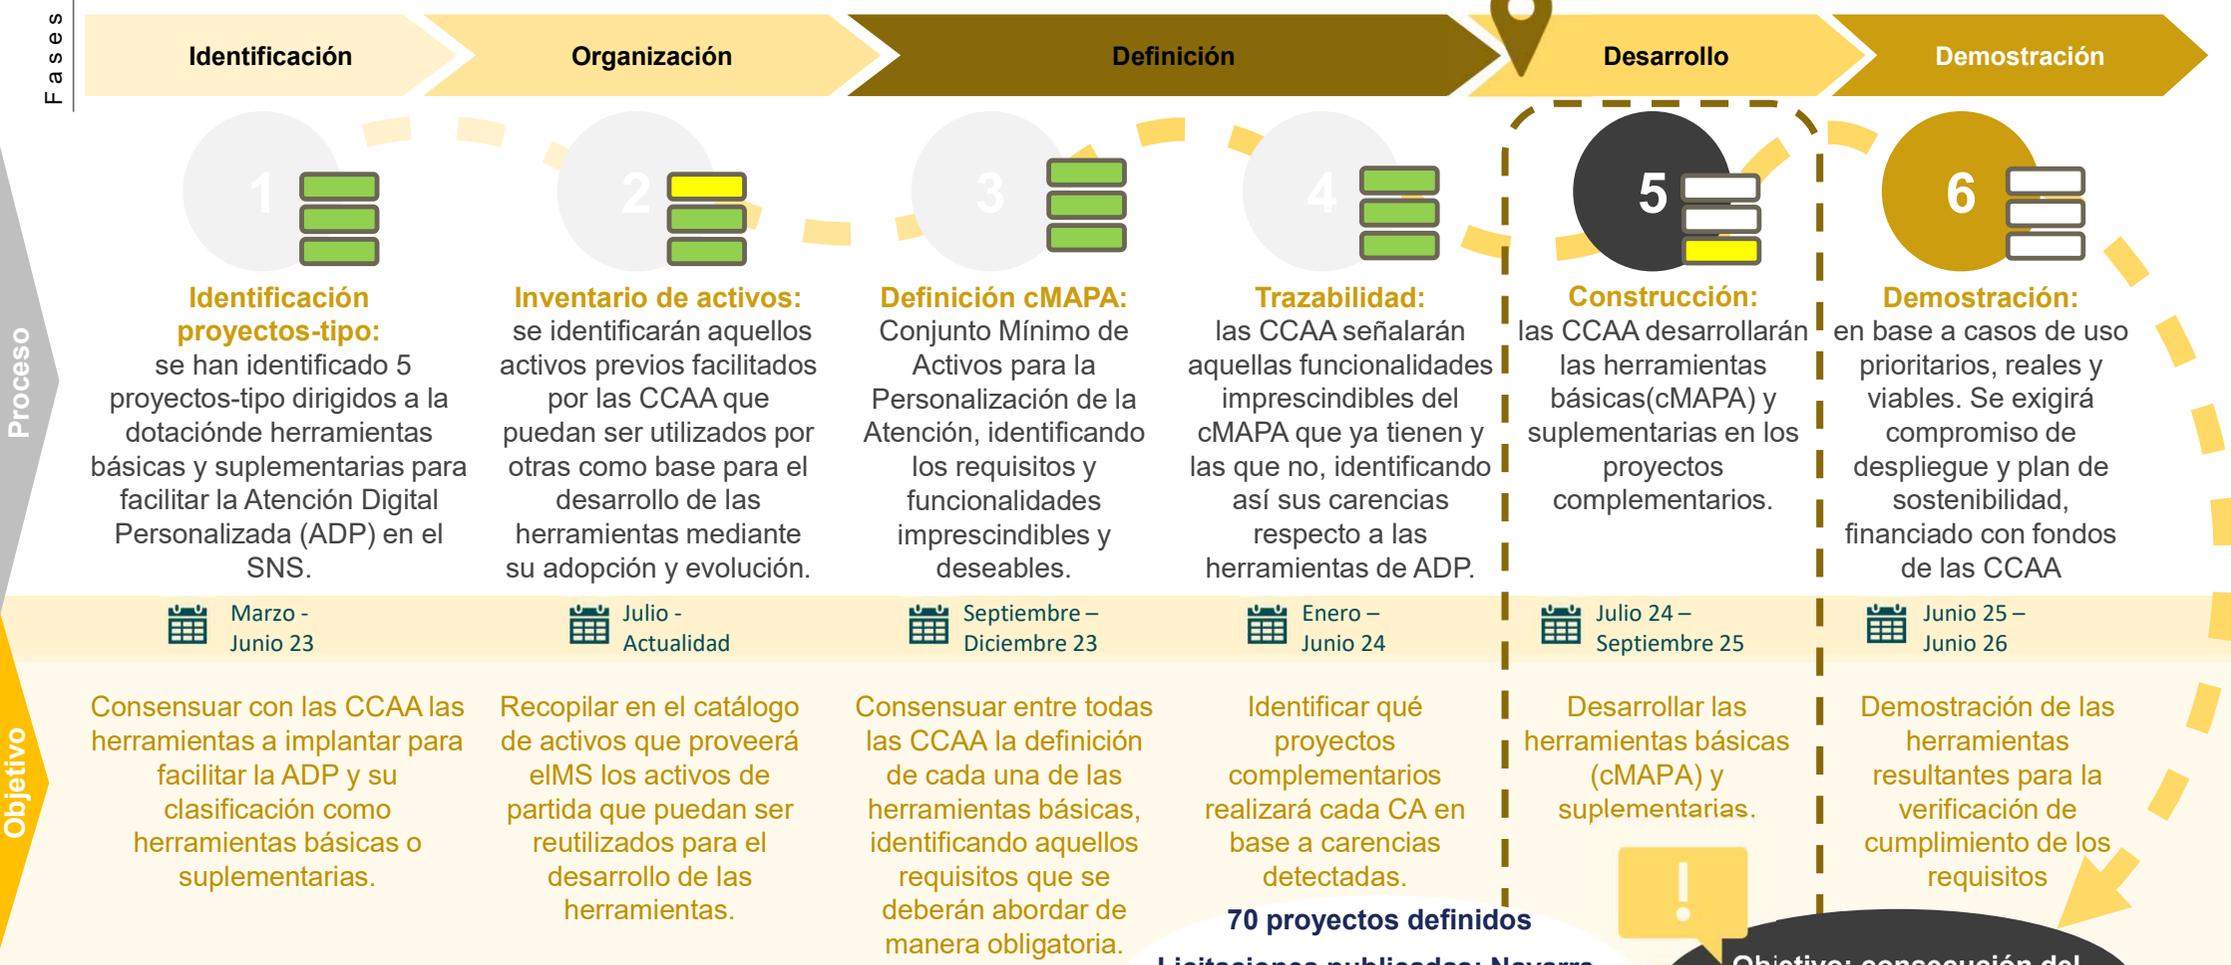


70 proyectos definidos
Licitaciones publicadas: Navarra, País Vasco, C. Valenciana, Canarias, La Rioja, Galicia, Castilla la Mancha

Objetivo: consecución del 100% del cMAPA por parte de todas las CCAA

4. Plan de Atención Digital Personalizada

Situación actual del proyecto ÚNICAS.

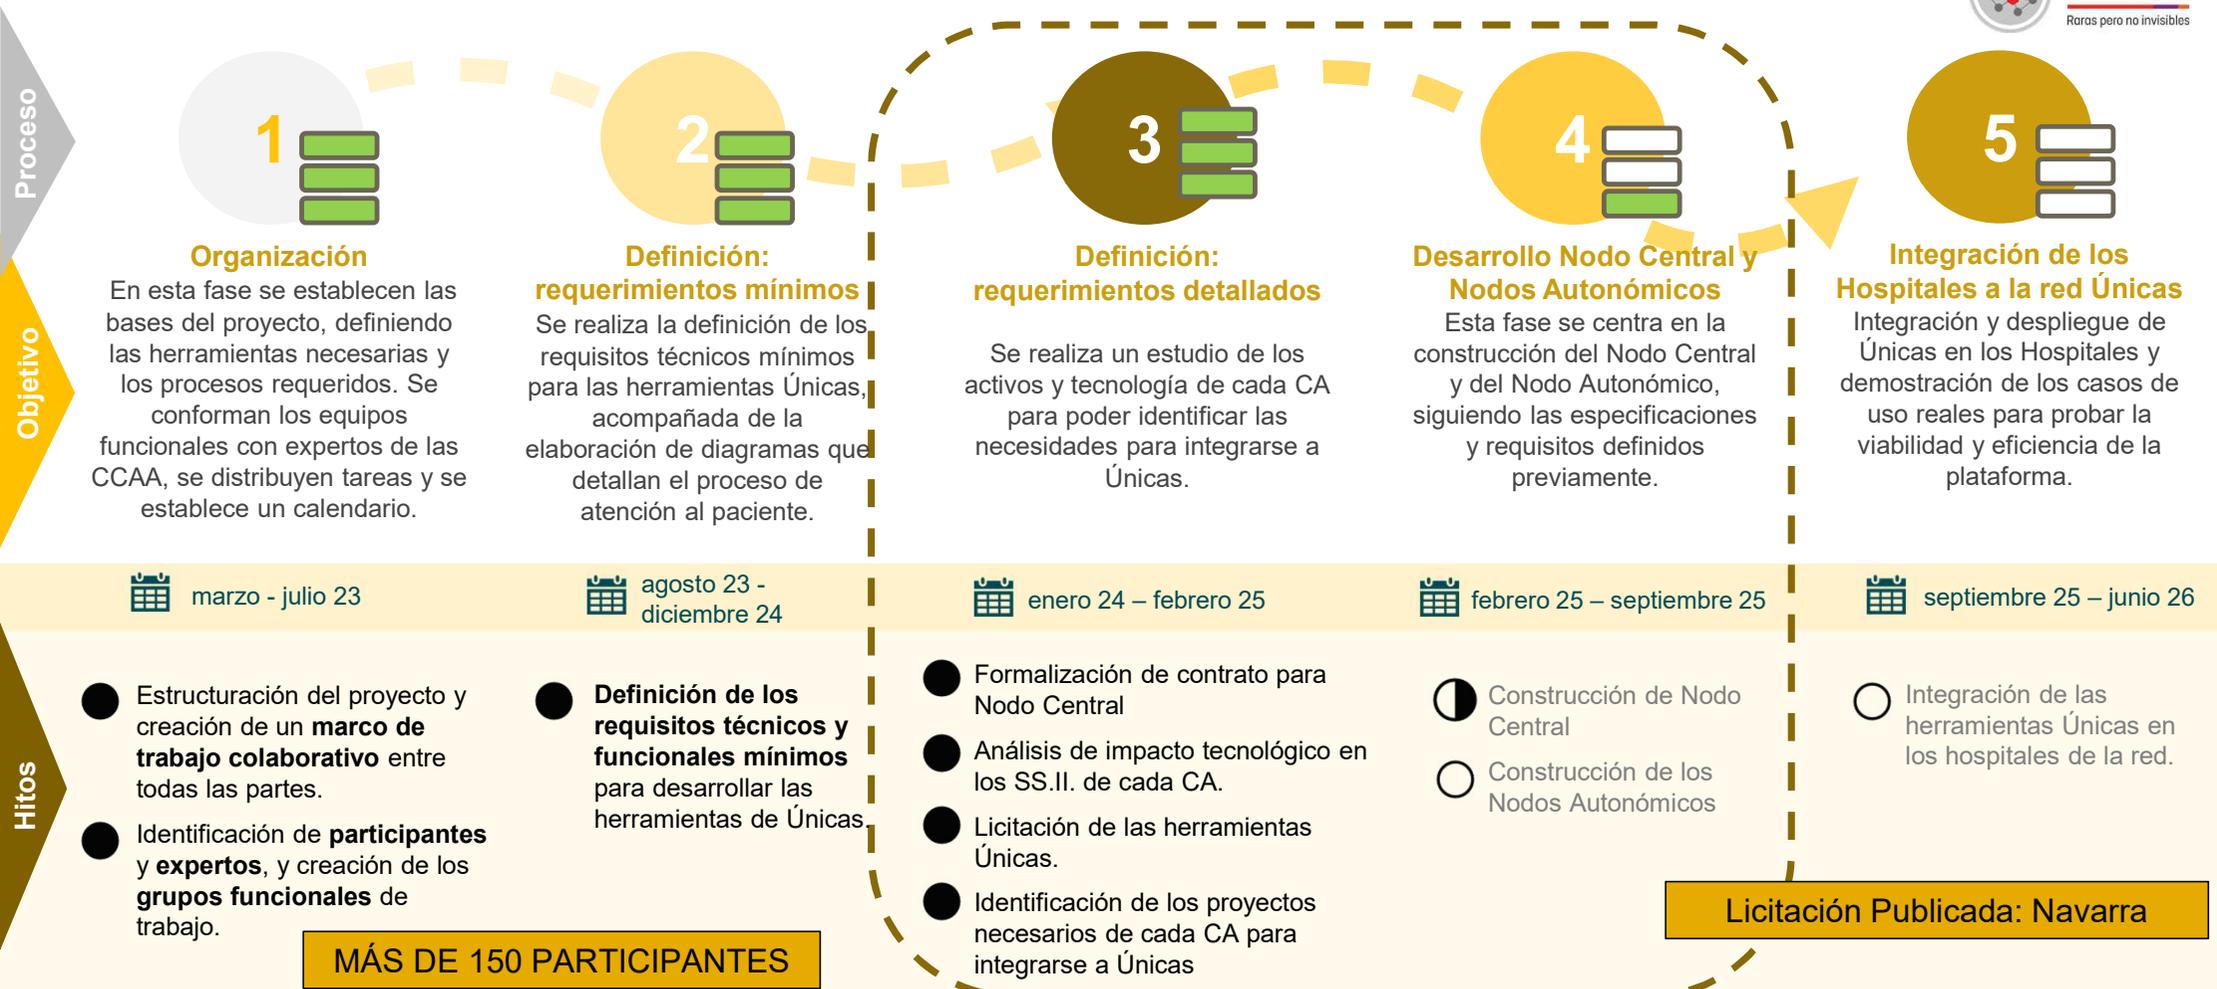

MÁS DE 150 PARTICIPANTES

Licitación Publicada: Navarra




● Hito alcanzado ◐ Hito en desarrollo ○ Hito pendiente

5. Sistema de Información para la integración de la información genómica en el SNS (SiGenES)

Actividades previstas

SiGenES se divide en **4 etapas** y actualmente nos encontramos en la etapa de **Construcción**

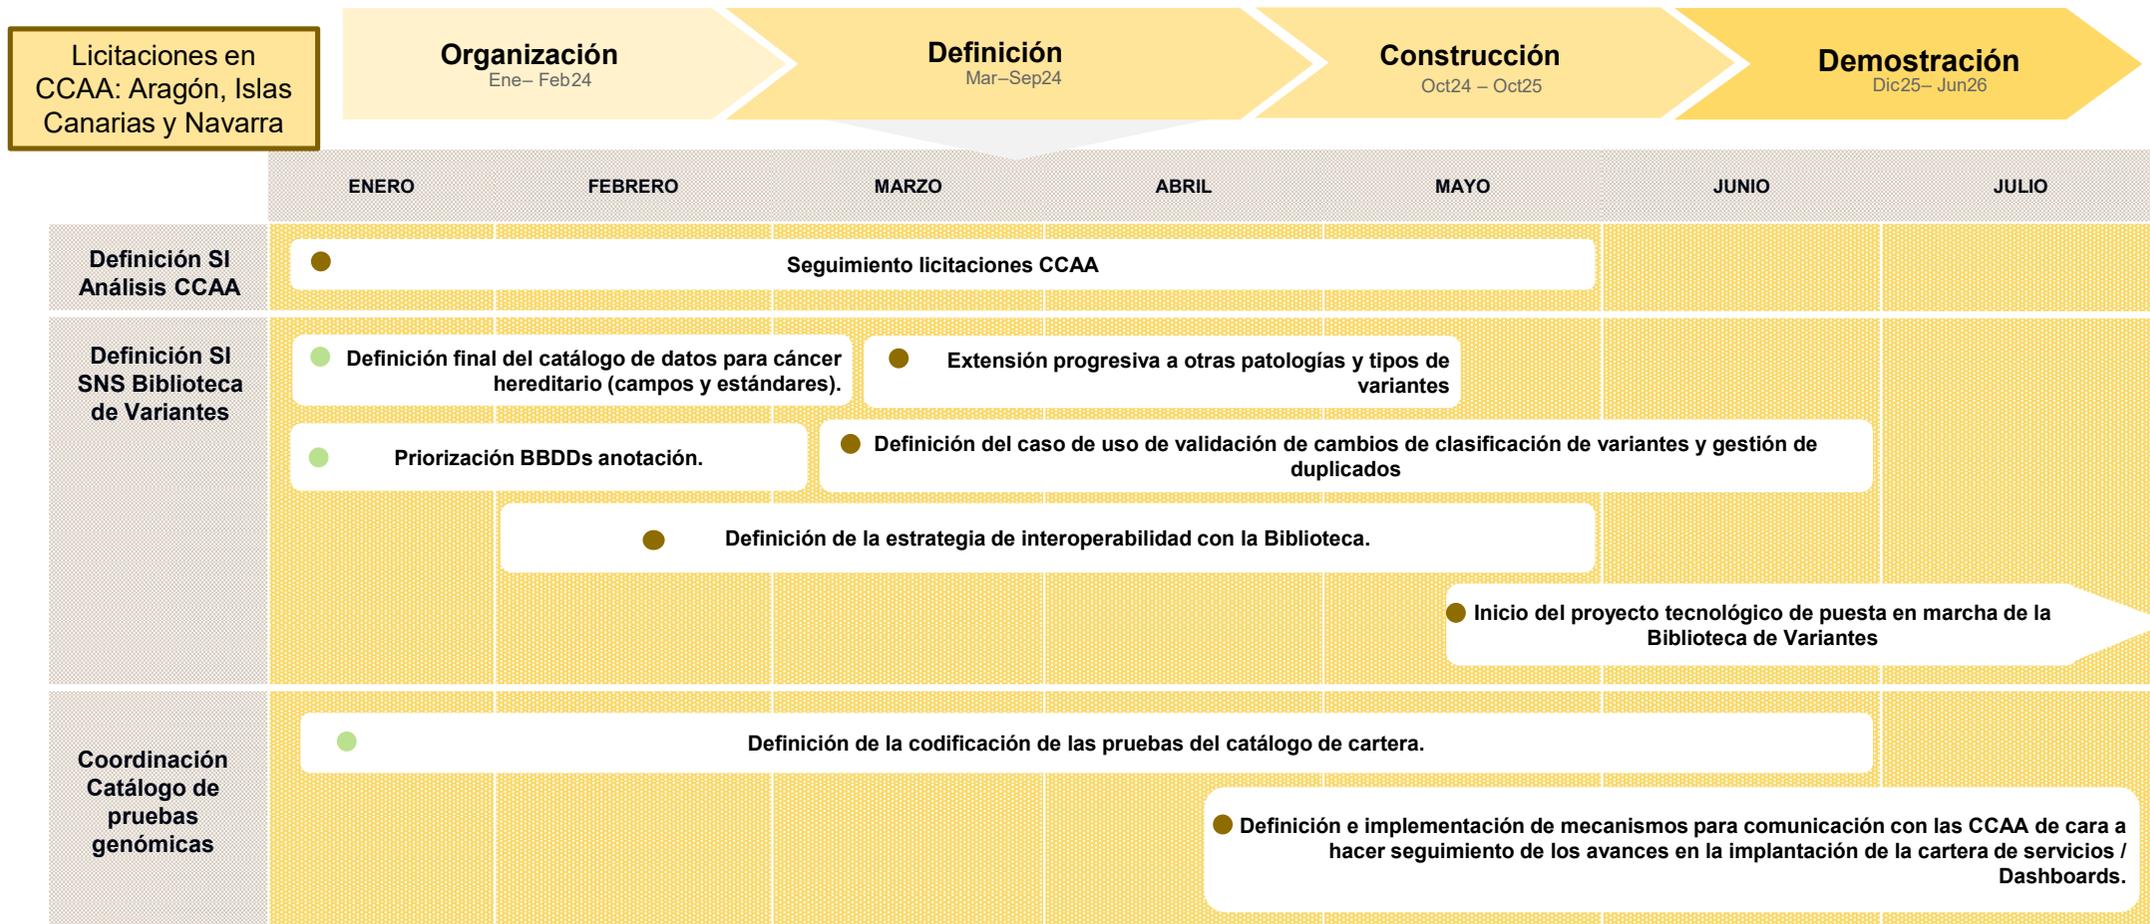

6. Espacio Nacional de Datos de Salud

Hitos, líneas de trabajo y reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud

COMPONENTE 18. Inversión 6. PERTE SALUD DE VANGUARDIA

1 Principales hitos

Ministerio de Sanidad y CCAA



Modelo de gobierno del dato en el SNS. Aprobado en CSD

- Constituidos **Comité de Casos de Uso y Comité Editorial.**
- **Acuerdo encargo de tratamiento de datos.** Borrador del acuerdo cerrado y en trámite
- **Documentos técnicos elaborados:** Flujo de datos; Calidad del dato; Arquitectura tecnológica; Modelo de gobernanza; Interoperabilidad; Analítica avanzada; Formulario casos de uso.

2 Principales líneas de trabajo



Implementación de los 2 casos de uso en curso:

- **Uso de antibióticos en el SNS.**
- **Predicción de descompensaciones en enfermedades crónicas.**

Desarrollo de CdU de Sanidad Exterior (rastreo automatizado enf. transmisibles)



Selección de nuevos casos de uso en grupo de trabajo ENDS:

- **Recibidas 26 propuestas (CCAA, ISCIII).** En estudio viabilidad, liderados por CCAA proponente.

SEDIA



- **Transferencia 28 ME** a las CCAA.
- **Licitación licencias** finalizada.
- **Licitación de la infraestructura** pendiente.

3 El Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud



PUBLICACIÓN EL 5/3/2025!

Nuevos derechos para ciudadanos y obligaciones para Estados, prestadores de atención sanitaria y tenedores de datos de salud

Uso primario y secundario, con nuevos organismos asociados.


Modelo de federación de nodos nacionales de los Estados Miembros.

02

**NNPP de Salud Digital
2024 - 2029**

2. Nuevos programas: 2025 - 2029

Contexto normativo novedoso, complejo y multiagente. Reto común, Solución compartida.



2. Nuevos programas: 2025 - 2029

APROBADOS EN CSD 18 JULIO

KICKOFF 22 NOVIEMBRE

PADP+ – ÚNICAS+

PADP

PADP+: implantar las herramientas desarrolladas y extender los pilotos PRTR

- Desarrollar los planes de despliegue e implantación de las herramientas PADP.
- Ampliar catálogo de herramientas, servicios y patologías cubiertas.
- Consolidar el modelo de Atención Digital Personalizada en el SNS.

ÚNICAS+: implantar extensiones identificadas

- Ampliar a otras patologías, otro grupos etarios y ELA.
- Integrar a la atención primaria en la red.
- Incorporar herramientas de IA y analítica avanzada.
- Incluir imágenes como recurso.

223M€ FEDER + MS

Marco estratégico

Estrategia de Salud Digital SNS

PERTE Salud de Vanguardia

Reglamento EHDS, IA, dispositivos médicos

GT7

IASNS

impulsará la **implantación de soluciones de IA** en el SNS.

- Apoyar la **desburocratización de la atención** para mejorar la calidad asistencial
- Liberar tiempo** profesionales sanitarios
- Fomentar la **equidad y cohesión en el SNS**, asegurando la implantación homogénea de la IA
- Impulsar el uso **coordinado** de la IA en el SNS para la mejora de la atención a los pacientes
- Reducir la **variabilidad** de la práctica clínica y facilitar la movilidad de los profesionales

GT5

RIIMSNS

permitirá el intercambio de imágenes médicas entre CCAA para la prestación asistencial y el uso secundario en línea con el EHDS

- Atención sanitaria sobre **imágenes independientemente de su ubicación**
- Seguridad y continuidad asistencial** del paciente en movilidad
- Facilitar las **interconsultas y segundas opiniones entre profesionales** del SNS
- Evitar la **duplicidad de pruebas**, reduciendo la exposición del paciente a la RX
- Uso secundario** de estudios de imágenes.

2. Nuevos programas: 2025 – 2029. Financiación

Marco de la colaboración MSAN-MTDyFP (Red.es) en el ámbito de los objetivos FEDER SANIDAD:

- *Implantación de programas de monitorización remota de patologías crónicas.*
- *Desarrollo de casos de uso basados en neurotecnología e IA.*



- **Se determinará el % mínimo de dedicación por programa según las actividades y acuerdos comprometidos (implantación de casos de uso básicos, asegurar interoperabilidad...) permitiéndose libre asignación del **15%****
- **Los proyectos deberán ser aprobados por el MSAN y por RED.ES.**
- **El resto del presupuesto por programa se podrá dedicar a proyectos de interés particular en cada una de las líneas.**

45% IASNS

20% RIIMSNS

20% PADP UNICAS

2. Nuevos programas: 2025-2029. Próximos pasos



Objetivo primer semestre 2025
definición alcance

Comunicación de Adhesión convenios

📅 Ene 25

Firma de convenios

📅 Feb 25 – Jun 25

Seguimiento convenio

📅 Fecha Firma – Dic 27 / 29¹



PRESENTACION

- Actuaciones comprometidas por programa.
- Calendario general.
- Modelo organizativo

CISNS
16/12/2024



CONFIRMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

- Las CCAA confirmarán con **fecha enero del 2025** su adhesión al convenio.



CCAA participantes convenios

FIRMA DE CONVENIOS TRILATERALES

Contenido:

- Aspectos generales
- **Actuaciones técnicas** comprometidas en cada programa (alineamiento SNS)

PUESTA EN MARCHA

Creación e inicio de la actividad de:

- Comisión de seguimiento Red.es – MSAN – CA definidos en CONVENIOS interadministrativos

Inicio de los programas

📅 Jul 24 – Dic 27/29¹

Los programas se iniciaron **en julio de 2024** con la **aprobación en la CSD**.

Aquellas CCAA que suscriban el convenio, **contarán con financiación FEDER** desde la firma.

IASNS

- Identificación referentes y coordinadores
- Inventario Algoritmos (+1,000)
- Mapa CdU IA

RIIMSNS

- Definición de casos de uso
- Definición de interoperabilidad

📅 Jul 26² – Dic 27/29¹

ADP Únicas

- Ampliación de ÚNICAS a otras enfermedades minoritarias.
- Integración con los sistemas de información de AP.
- Incorporación de la información adicional que genere ÚNICAS a la Historia Clínica Digital.
- Ampliación de datos mínimos a compartir en la red ÚNICAS (datos genómicos, procesos de cribado e imagen médica).
- Incorporación del uso secundario (ENDS).
- Aplicación de IA.

¹ Ejecución hasta 2027 y prorrogable hasta 2029

² Ampliación del programa aprobada en el 2024, ejecución a partir de julio 2026 para evitar doble financiación con PRTR

03

Riesgos de ejecución

3. Riesgos de ejecución

Planes de contingencia



3 CCAA restan por mandar su plan de contingencia

Las CCAA han desarrollado sus propios **planes de contingencia** para mitigar riesgos en sus territorios como complemento a las medidas realizadas por el Ministerio. A continuación, se muestran los riesgos más significativos identificados:

RIESGOS

Dificultades para **coordinar y compaginar las reuniones de seguimiento y trabajo** de los programas dado que los asistentes son, en su mayoría, coincidentes.

Falta de recursos humanos dedicados a los proyectos de Salud Digital de los programas.

Demoras en la **tramitación administrativa y formalización de instrumentos jurídicos**.

MITIGACIÓN

- Aprovechamiento de **sinergias entre programas** presentes y futuros
- **Unificación de Grupos de Trabajo** en base a objetivos comunes
- Incorporación de más **recursos funcionales** a los proyectos.

- **Contrataciones externas de consultoría y Oficinas Técnicas** funcionales y de gestión de Fondos Europeos.
- Lanzamiento de **convocatorias de captación de recursos expertos en Salud Digital y IT**.

- Incorporar la figura de **coordinador de contratación**, que coordine la redacción de pliegos y la gestión junto al servicio de coordinación.
- Aumentar la **coordinación con los Grupos de Trabajo**, disponiendo más información de la ejecución de los proyectos para su inclusión en la licitación.

RENDICION DE CUENTAS PRTR: Respondidas más de **60 consultas** de CCAA por equipo especializado de la **SGSDII**



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

**(+) + Estrategia de
Salud Digital**



**Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**

04

**ANEXO: INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA**



Plan de Servicios Digitales del SNS

2. Plan de Servicios Digitales del SNS

Estado actual

+30

Servicios digitales disponibles a través del nodo de interoperabilidad del SNS

49M


Usuarios dados de alta en Tarjeta Sanitaria Individual

+2M

Personas que han utilizado la Receta Electrónica Interoperable, **357 mil** en diciembre 2024.

90%

Población con información en la Historia Clínica Digital Interoperable

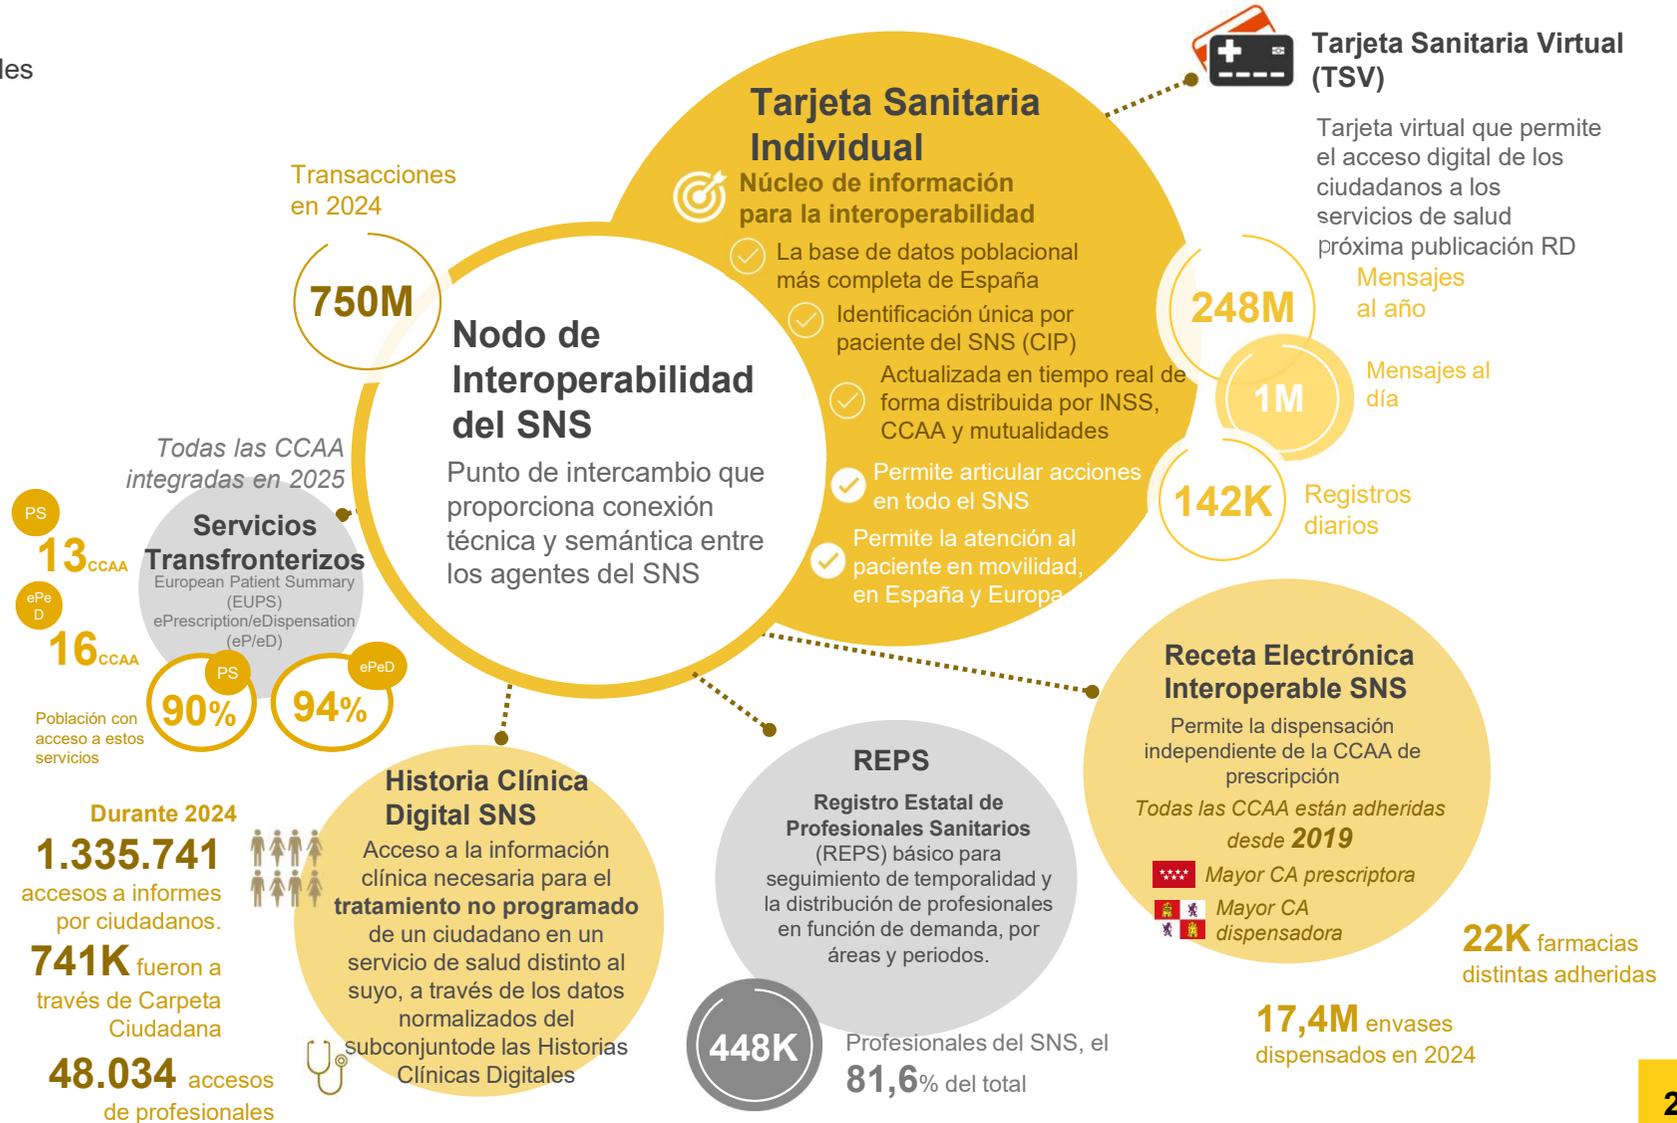


2. Plan de Servicios Digitales del SNS - Receta electrónica interoperable

Evolución en la utilización de la receta electrónica interoperable

PERSONAS QUE HAN UTILIZADO EL SERVICIO DE RECETA ELECTRÓNICA INTEROPERABLE DEL SNS. Año 2024

Distribución porcentual * según CA prestadora del Servicio

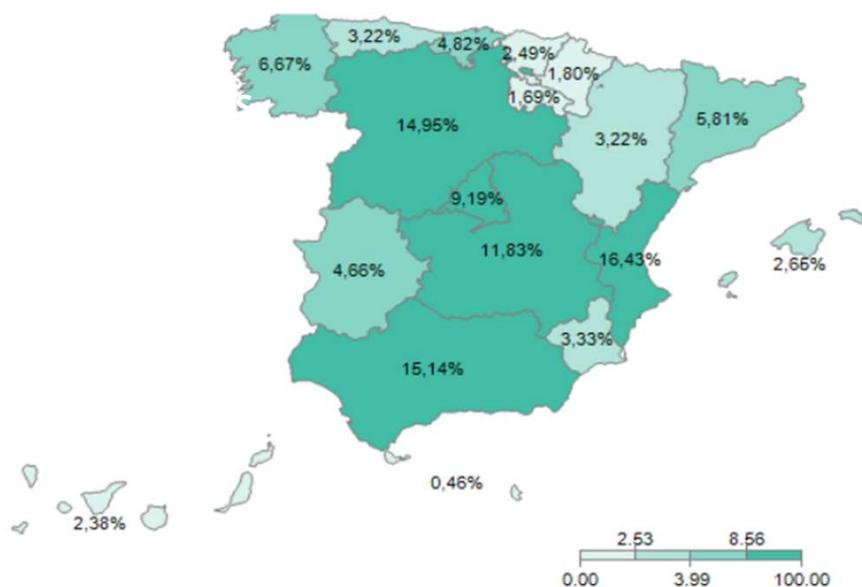

2.298.998


Ciudadanos distintos en 2023

2023 vs 2024

2.441.453

Ciudadanos distintos en 2024

Distribución porcentual * según CA de origen

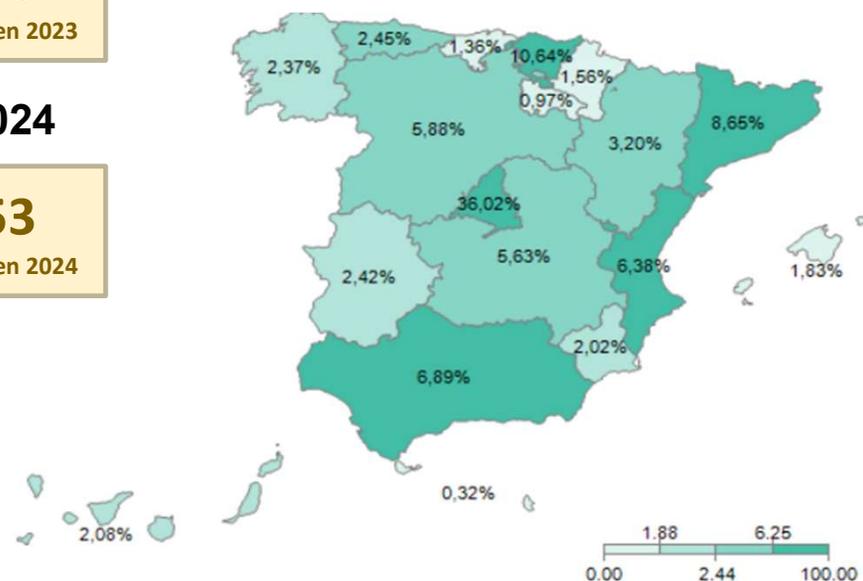

* Distribución porcentual de las personas que han recogido su medicación en una CA distinta a la suya, según la CA donde han obtenido los productos prescritos. Cada persona ha podido utilizar el servicio una o más veces, pero solo se contabiliza una vez

* Distribución porcentual de las personas que han recogido su medicación en una CA distinta a la suya, según su CA de origen. Cada persona ha podido utilizar el servicio una o más veces, pero sólo se contabiliza una vez

- 2,4 millones de personas la utilizaron
- 7,4 m de actos de dispensación
- 17,4 m de envases dispensados


2. Plan de Servicios Digitales del SNS – Receta electrónica interoperable

Evolución de los datos clave de dispensación en receta electrónica interoperable del SNS.

Datos actualizados a último año vencido

2015– 2024

(7 julio 2015 – 31 diciembre 2024)

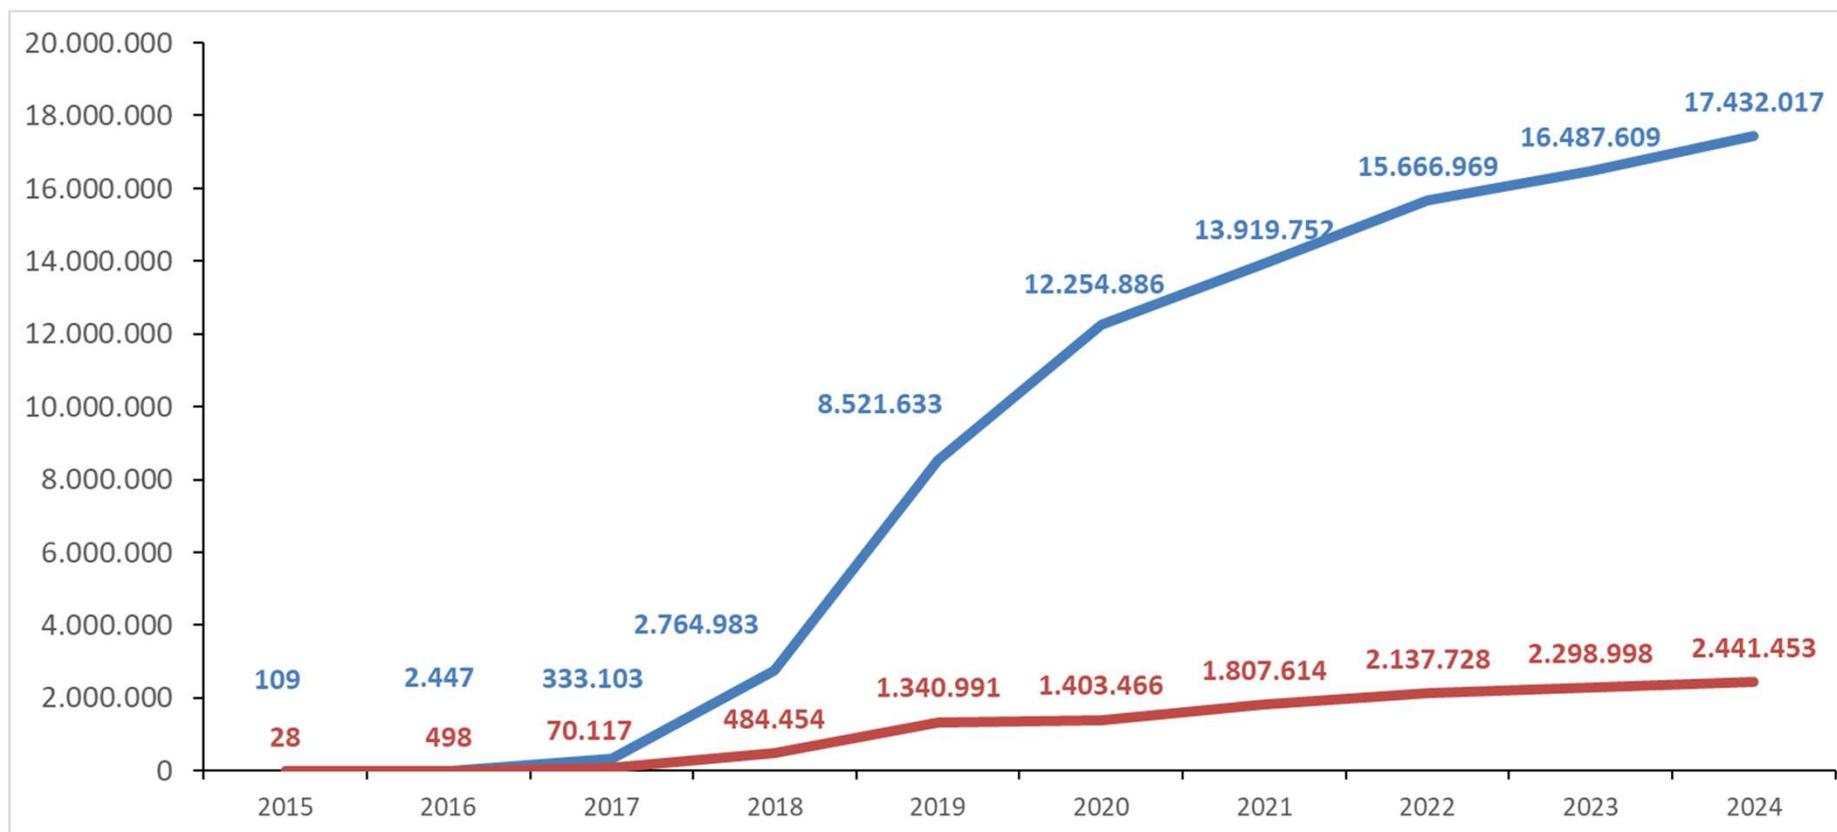


2. Plan de Servicios Digitales del SNS – Receta electrónica interoperable

Evolución de los datos clave de dispensación en receta electrónica interoperable del SNS.

Datos actualizados a 11/02/2025

Diciembre 2021- Diciembre 2024

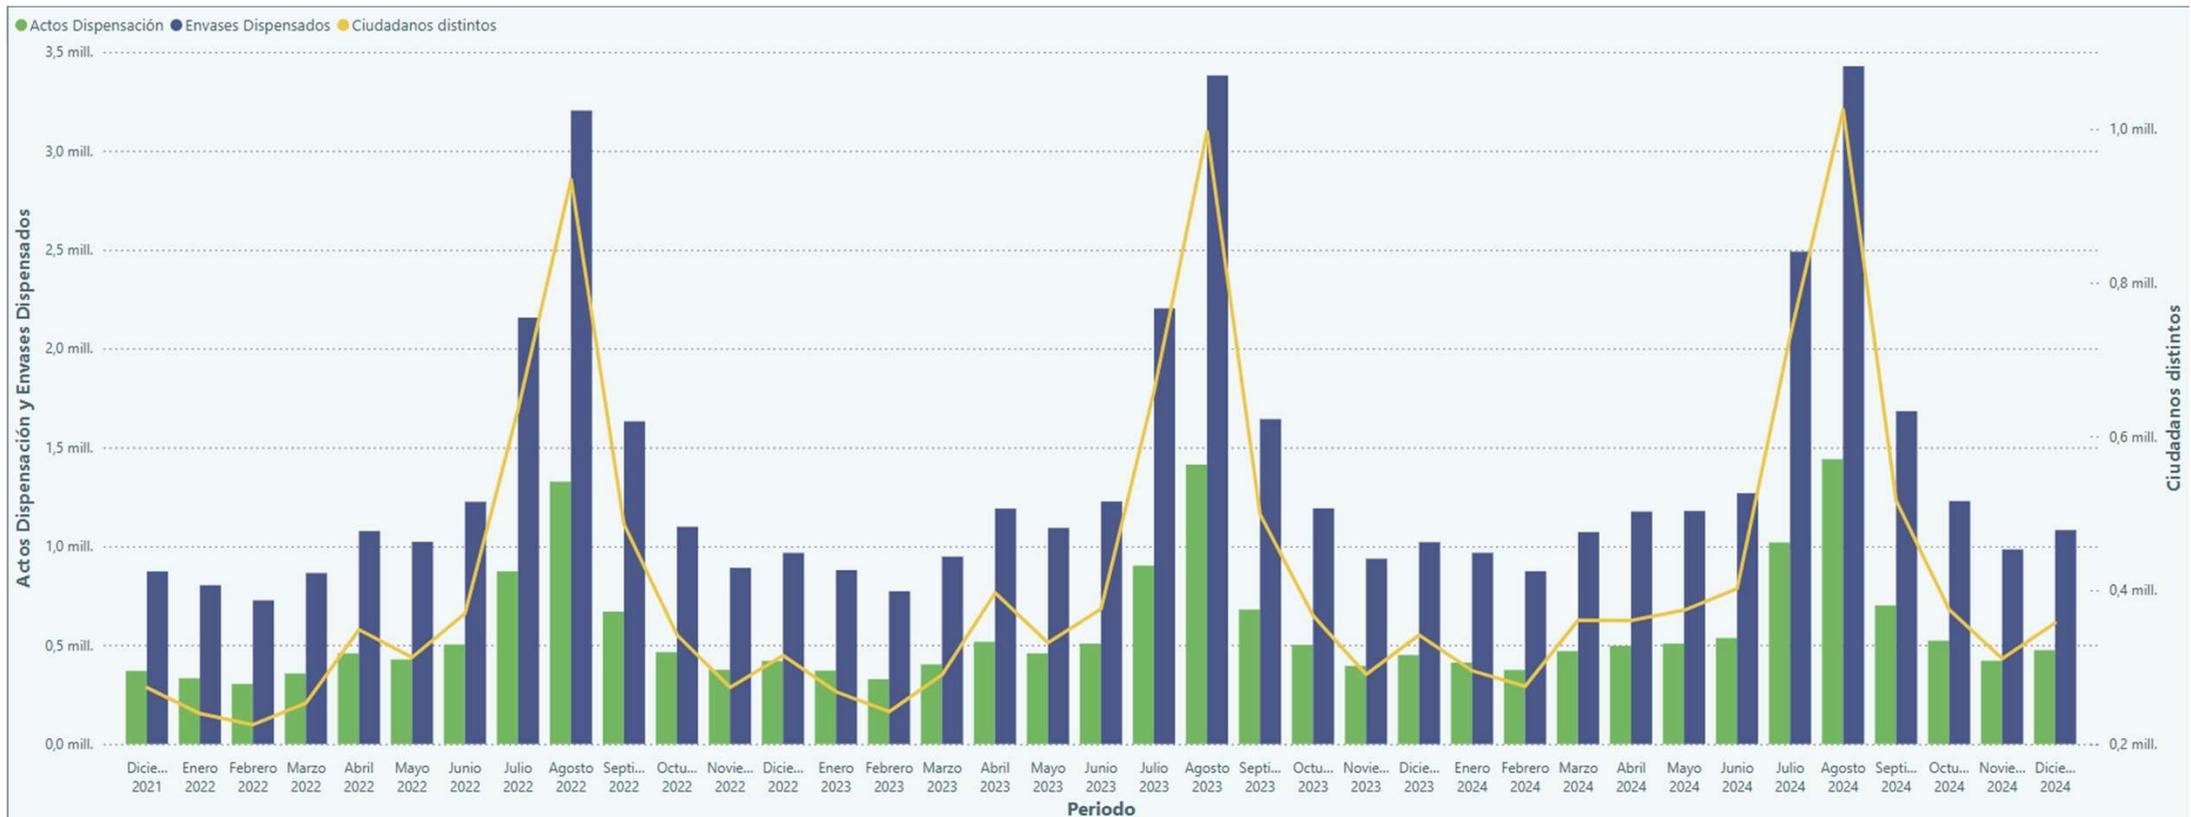

2. Plan de Servicios Digitales del SNS – Historia Clínica Interoperable SNS

Historia Clínica Interoperable SNS

En julio 2023 se lanzó acceso a través de “Carpeta Ciudadana CC”.
90% de la población protegida tiene contenidos en HCDSNS.

Desde el inicio, se han efectuado **más de 1.031.000 accesos** a informes clínicos por parte de los ciudadanos **a través de CC, de un total de 1.874.000 accesos** realizados



Con más de 7.500 incidencias atendidas por el CAU servicios, principalmente por no poder ver informes. El 99,9% resueltas

RD CMDIC 2010
Acceso con ID electrónica

PROFESIONALES

Normalización
de informes mediante
RD CMDIC
(última modificación
4 julio 2023)

- Historia Clínica Resumida (HCR)
- Informe Clínico de Atención Primaria (ICAP)
- Informe Clínico de Alta (ICA)
- Informe Clínico de Consulta Externa (ICC)
- Informe Clínico de Urgencias (ICU)
- Informe de Cuidados de Enfermería (ICE)
- Informe de Resultados de pruebas de imagen (IRPI)
- Informe de Resultados de pruebas de laboratorio (IRPL)
- Informe de Resultados de otras pruebas diagnósticas (IROPD)
- Patient Summary (PS)

PERSONAS


Pueden ocultar/ desocultar su información y revisar accesos de los profesionales

2. Plan de Servicios Digitales del SNS – Historia Clínica Interoperable SNS

Historia Clínica Interoperable SNS

Datos actualizados a 31/01/2025

- En los meses estivales existe un incremento de las consultas* a todos los tipos de informes por parte de profesionales
- Desde enero de 2024 hasta el 31 enero 2025, se han efectuado **más de 18.500 consultas*** al informe HCR por profesionales

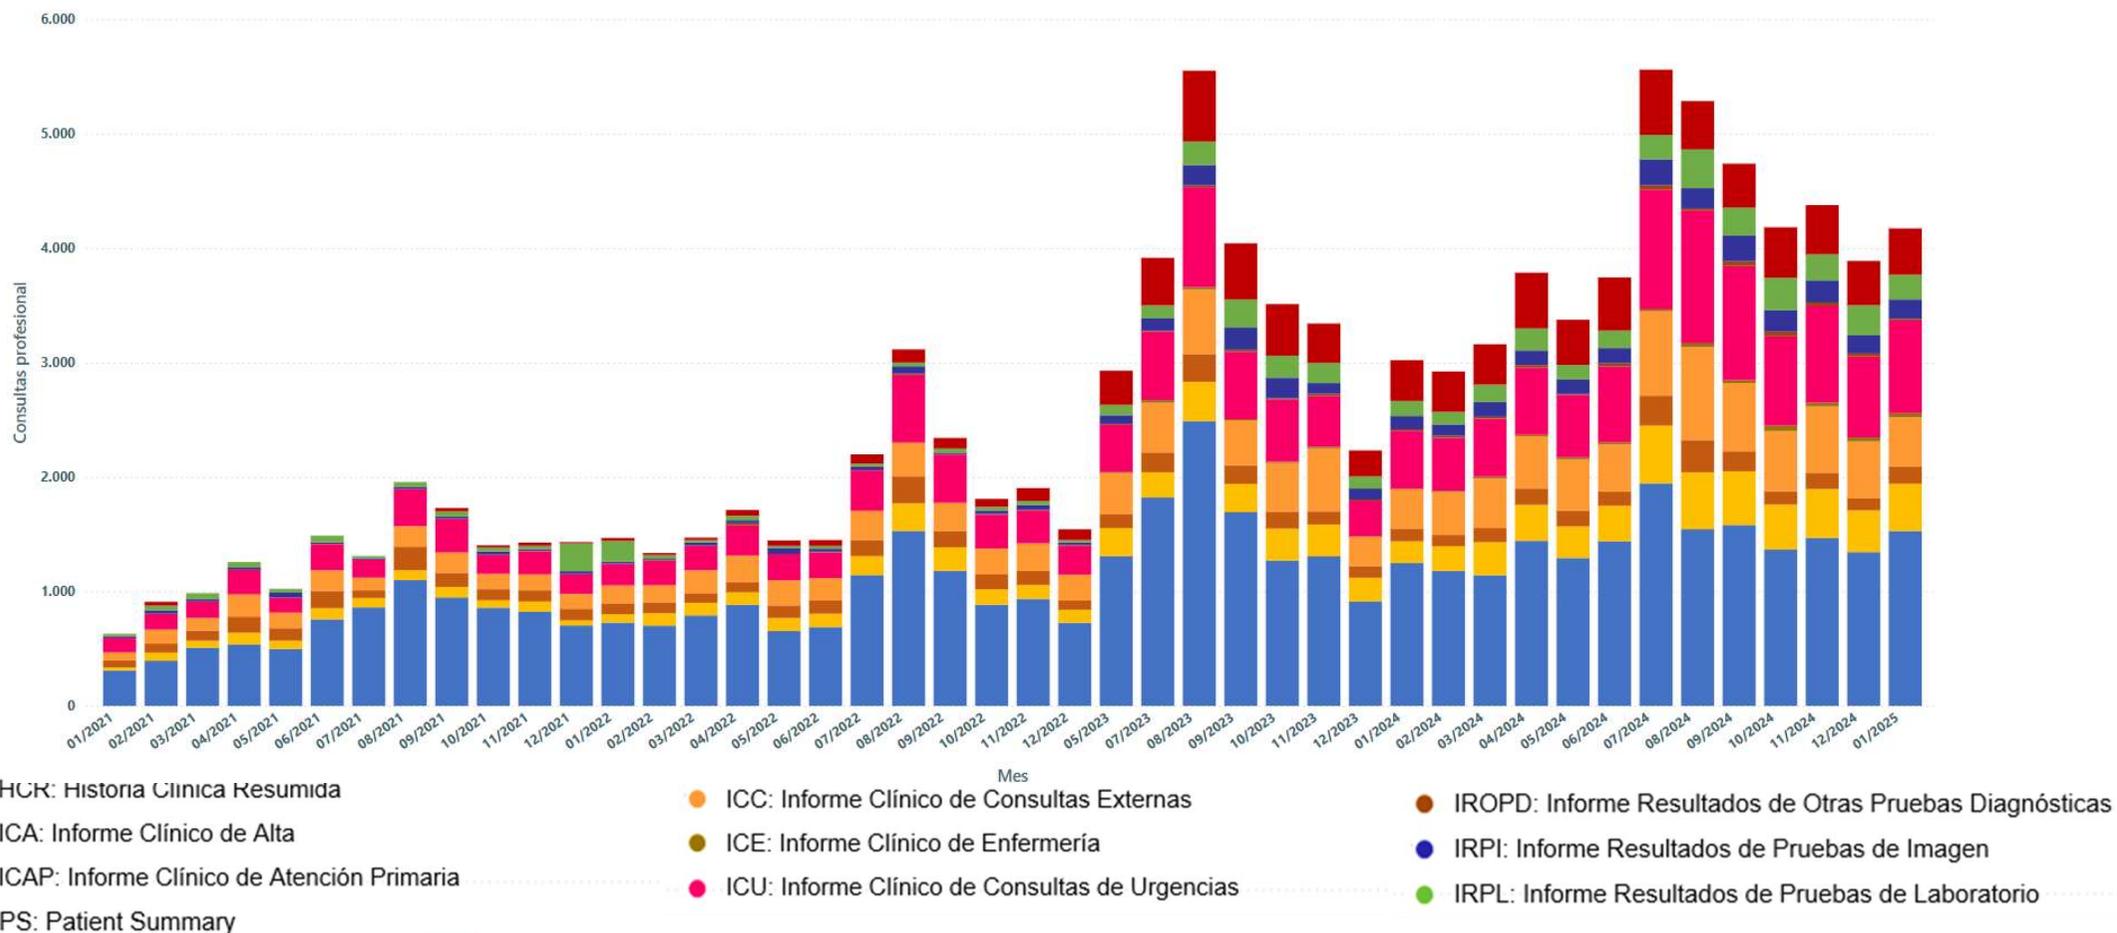

* Se contabilizan todas las consultas efectivas a informes que hayan efectuado los profesionales a su misma o a otra CCAA.



2. Plan de Servicios Digitales del SNS – Escenario europeo

Estado actual del escenario europeo

Datos actualizados a 09/02/2025

European Patient Summary (EUPS)

ePrescription/eDispensation

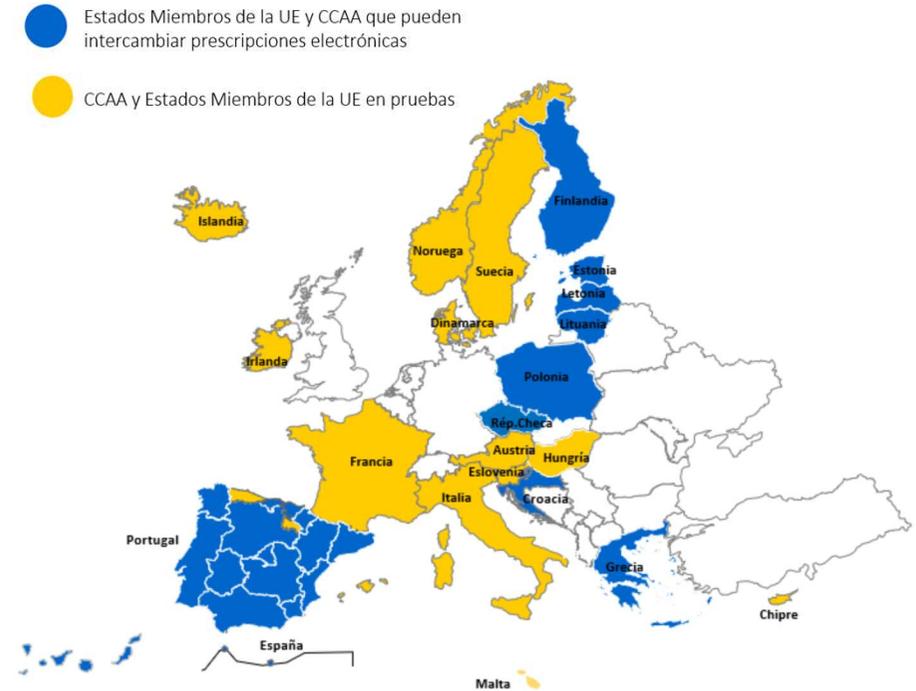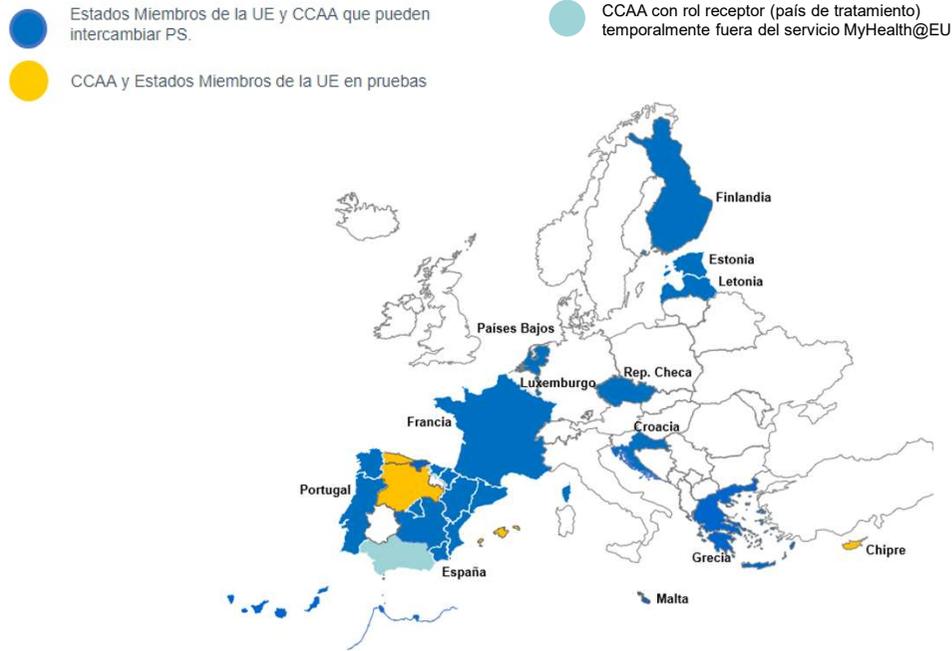

Comparativa último Comité Consultivo (28/11/2024):

INGESA entra en producción en diciembre de 2025
 Temporalmente fuera del servicio MyHealth@EU: **Andalucía**

2. Plan de Servicios Digitales del SNS – Servidor de Terminologías de Referencia del SNS

Estado de integración de las CCAA.

Crítico en la normalización de datos clínicos.

Ofrece servicios de consulta y descarga de recursos terminológicos relevantes para el SNS.

Permite actualizar contenidos de forma sincronizada en los servidores terminológicos de las distintas CCAA.

Datos actualizados a 10/02/2025



La mayoría de las CCAA realizan un uso efectivo: usan los servicios de consulta y descarga de recursos.

■ Recursos Estándares SNS
 ■ Recursos de Medicamentos
 ■ Proyectos de interoperabilidad nacional/internacional

Recursos semánticos disponibles		
SNOMED CT	LOINC	ATC. <i>Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system</i>
CIE-10-ES	ORPHA	Nomenclátor de Facturación
CIE-10-PCS	Catálogo SERAM	Catálogo SIVAIN
CIE-9-MC	Catálogo SEMNIM	Catálogos Proyectos Europeos
CIAP-2	Nomenclátor de Prescripción	Catálogo de Antimicrobianos de Farmacia Hospitalaria *
CIE-0-3.1	BIFIMED	

**solo disponible en formato de descarga, en desarrollo consulta API*

Recursos semánticos que se incluirán próximamente	
Catálogos SEIMC	Catálogos RENAVE
Catálogos Únicas	Recursos para SIGenES



**Plan de Sostenibilidad,
mejora de la eficiencia y
acceso equitativo al
SNS**

3. Plan de Sostenibilidad, mejora de la eficiencia y acceso equitativo al SNS

Objetivos y ámbitos del programa.

AMPLIADO PLAZO EJECUCIÓN DIC 2025

Este plan es un **convenio de colaboración**, cuyo objetivo es establecer y articular un espacio de colaboración para la consecución de objetivos **FINALISTAS** en materia de **sostenibilidad del SNS, mejora de la eficiencia, racionalización del gasto farmacéutico público, acceso de los pacientes a la innovación de forma equitativa** en todo el territorio español. En coordinación con Hacienda, requerirá conformidad de avance por parte de las **Consejerías de Hacienda de las CCAA** por el carácter **finalista** de la inversión.

En el marco de este convenio, en 2021 se aprobó un Plan de trabajo para el impulso de la Salud digital, por el que se transfirieron **220 millones €** a las Comunidades Autónomas para la ejecución de proyectos **hasta diciembre de 2025** en **5 áreas estratégicas**:



3. Plan de Sostenibilidad, mejora de la eficiencia y acceso equitativo al SNS

Proyectos puestos en servicio.

PROYECTOS FINALIZADOS

CCAA	Proyecto	Descripción	Macroproyecto
La Rioja	Mejora de la gestión de RRHH - Planificación de Turnos	Implantación y despliegue de los módulos: administración de personal, planificación, formación y canal de comunicación (web y app móvil) de la plataforma para la gestión de recursos humanos	3.1. Ampliación y Renovación Digital de Centros Sanitarios
Navarra	Cristales Anatomía Patológica	Suministro de los sistemas necesarios y su implantación para digitalizar las preparaciones histológicas y el proceso de diagnóstico de anatomía patológica	3.2. Sistemas Integrados de Gestión y Análisis de Imágenes Médicas
Aragón	Transformación digital de la Atención Personalizada	Implementación de servicios digitales para optimizar la atención sanitaria en Aragón. Incluye telemonitorización para crónicos , acceso virtual al sistema y formación ciudadana , eliminando barreras y mejorando la participación activa en el cuidado de la salud.	3.1. Ampliación y Renovación Digital de Centros Sanitarios
País Vasco	Desarrollo e implantación de algoritmos de IA en imagen médica para la ayuda al diagnóstico	Desarrollo de una plataforma de algoritmos de inteligencia artificial para apoyar el diagnóstico médico en imágenes , cumpliendo con la normativa sanitaria. Incluye algoritmos para detectar cáncer de mama, renal, piel, hepático, pulmonar, colon, ganglios metastásicos, degeneración macular, glaucoma y desviaciones de columna.	3.2. Sistemas Integrados de Gestión y Análisis de Imágenes Médicas
La Rioja	Sistema de información Radiológica y Sistema de almacenamiento para imágenes médicas	Incorporación de tecnologías de inteligencia artificial y postprocesado de imágenes radiológicas para ayudar al diagnóstico en diversos servicios (Cirugía Vascular, Neurología, Oncología, etc.) y modalidades (TAC, resonancia magnética, radiología convencional)	3.2. Sistemas Integrados de Gestión y Análisis de Imágenes Médicas
Islas Baleares	Modelo Balear de Interoperabilidad de Datos Clínicos	Creación de un arquetipo de historia clínica y un hub para compartir datos entre residencias públicas y la BDAC en Illes Balears . Integración de datos clínicos y sociales de 39 residencias (3.600 plazas), optimizando la gestión y permitiendo un repositorio compartido para sanidad y residencias.	4.3. Planes y Estrategias acordados en CSD



Plan de Transformación Digital de Atención Primaria

4. Plan de Transformación Digital de Atención Primaria

Objetivos y ámbitos del programa.

En el marco de la **Estrategia de Salud Digital** y del **PERTE de Salud de Vanguardia**, y como uno de los objetivos del **Plan de acción de Atención Primaria y Comunitaria** aprobado por el pleno del Consejo Interterritorial el día 15/12/2021 la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación puso en marcha con las CCAA el **Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria y Comunitaria**.

Este plan, cuenta con una financiación de **230 millones de euros** (70 millones de euros en 2022 y 160 millones de euros en 2023).

Se han identificado 3 bloques de actuación **en el marco de la Estrategia de Salud Digital para la digitalización de la Atención Primaria:**

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD SANITARIA

Impulso a la **transformación digital de los servicios que dan soporte a la actividad sanitaria** en los Centros de Salud y en su relación con el ciudadano, facilitando así el trabajo de los profesionales de administración y facultativos.

CENTRO SANITARIO INTELIGENTE

Implementación de **herramientas tecnológicas para facilitar la atención sanitaria en los Centros de Salud**, mejorando la calidad de los servicios para los pacientes y facilitando el trabajo de los profesionales.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Aprovechando las posibilidades de la tecnología, desarrollo de la cartera de servicios de los Centros de Salud específicamente diseñados para **colectivos de pacientes que requieren una atención personalizada, continuada y sistemática**, en función de sus circunstancias de vida y de salud.

4. Plan de Transformación Digital de Atención Primaria

DOS AÑOS DE EJECUCIÓN ESD – Mapa de intereses

AUMENTO DE CCAA involucradas

ÁREAS FUNCIONALES	GRUPOS DE TRABAJO	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	COMUNIDADES AUTÓNOMAS*																	Nº CCAA Involucradas				
			Andalucía	Aragón	Canarias	Cantabria	Castilla y León	Castilla-La Mancha	Cataluña	INGESA	C. Madrid	C. F. Navarra	C. Valenciana	Extremadura	Galicia	Illes Balears	La Rioja	País Vasco	P. Asturias		R. Murcia			
1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD SANITARIA	GT 1: TECNOLOGÍAS TRANSVERSALES	Ciberseguridad	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1		1	14		
		Cuadro de Mandos			1	1	1			1	1			1					1		1		8	
		Procesos para la Eficiencia en la Gestión									1		1		1		1	1	1	1		1	7	
	GT 2: RRHH Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Profesional Digital	1		1	1	1				1	1			1								8	
2. CENTRO SANITARIO INTELIGENTE	GT 3: CANAL DEL CIUDADANO	Escuela del Paciente y Promoción de la Salud																						
		Gestión Inteligente de la Demanda	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	
		Teleconsulta / Interconsulta																						
	GT 4: HISTORIA SALUD DIGITAL	Historia Clínica Inteligente																						
		Integración datos AP para Vigilancia Epidemiológica	1		1	1		1	1	1	1		1	1	1	1				1				12
		Integración Información Sociosanitaria																						
GT 5: INTEGRACIÓN DE DISPOSITIVOS E IMAGEN MÉDICA	Imagen Médica						1	1		1	1	1	1											
	Dispositivos en Centros		1	1	1			1	1		1	1	1					1					10	
3. ATENCIÓN PERSONALIZADA	GT 6: TELEMONITORIZACIÓN DE PACIENTES	Telemonitorización		1	1	1		1	1		1	1	1		1						1		10	
		Integración de señales IoT																						
	GT 7: SOPORTE A LA DECISIÓN CLÍNICA	Servicios y Casos de Uso de Inteligencia Artificial	1		1		1	1	1		1	1	1		1		1				1		11	

*Se marcan con un recuadro negro aquellas CCAA que han cambiado su rol dentro de los GTs por incorporar o desestimar proyectos desde el inicio del PTAP.

LIDER
PARTICIPANTE
INTERESADO


4. Plan de Transformación Digital de Atención Primaria

DOS AÑOS DE EJECUCIÓN ESD – Principales casuísticas encontradas

Las CCAA han aumentado la asignación presupuestaria a los proyectos colaborativos

Comparativa de presupuestos y proyectos

	Presupuestos 2022	Presupuestos 2024
Presupuesto proyectos colaborativos	167.890.229,72 €	174.555.539,9 €
Número proyectos colaborativos	110	108
Presupuesto proyectos individuales	47.466.242,70 €	44.585.733,74 €
Número proyectos individuales	37	38
Presupuesto Oficinas de Proyecto Líder	14.643.527,57 €	10.858.725,99 €
Número OPLs	13	12

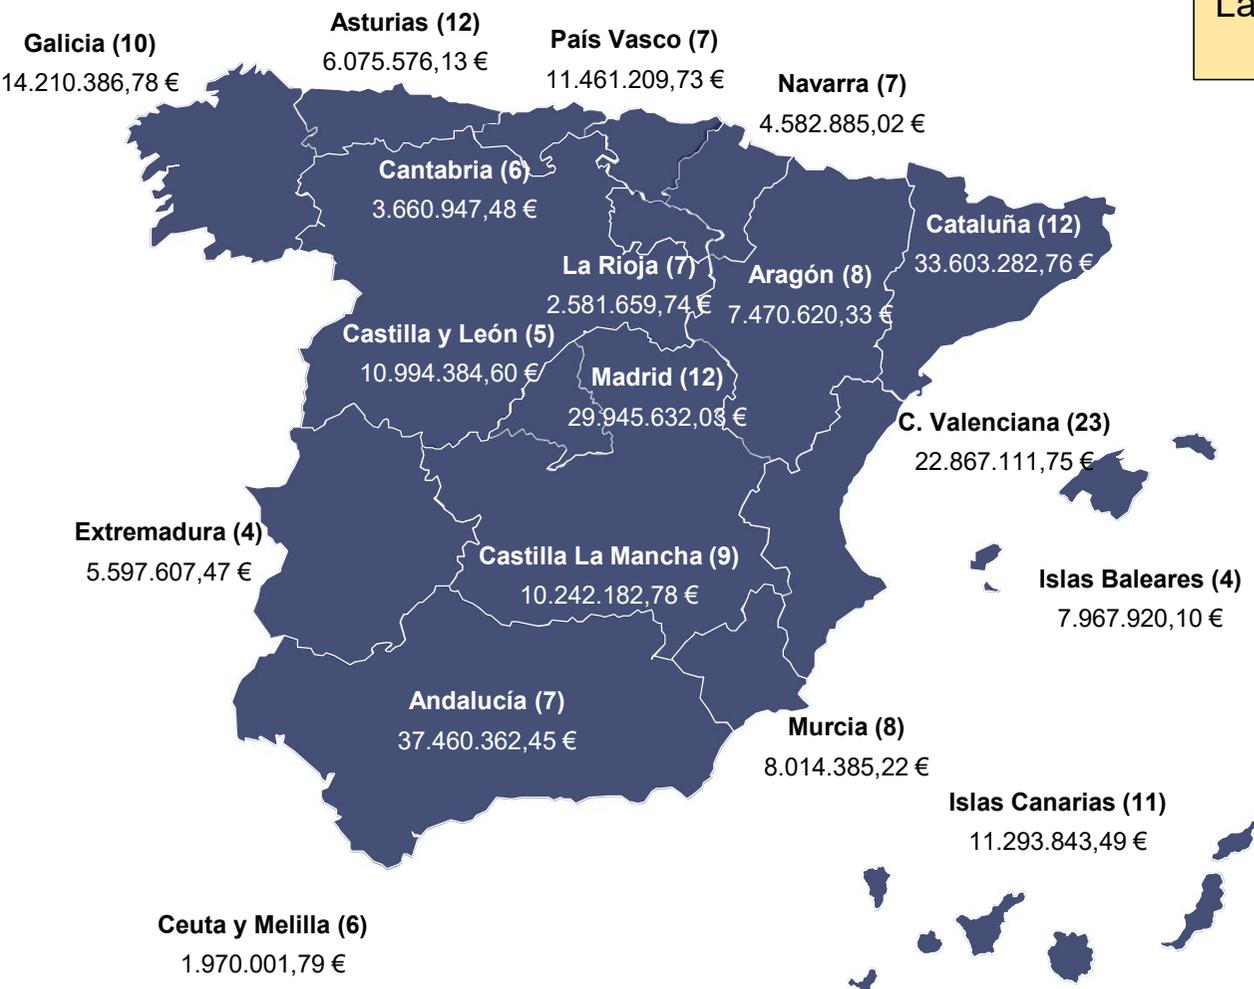

4. Plan de Transformación Digital de Atención Primaria

Listado de proyectos del programa finalizados

PROYECTOS EN FASE PILOTO O PUESTOS EN SERVICIO

CCAA	Proyecto	Descripción	Grupo de Trabajo
Extremadura	Adquisición y puesta en marcha de dispositivos tecnológicos (retinógrafos) para el programa de Detección Precoz de Retinopatía Diabética	Adquisición de dispositivos tecnológicos para mejorar la equidad y la universalidad del acceso de la población al Programa de Detección Precoz de Retinopatía Diabética.	GT5. Integración de Dispositivos e Imagen Médica
C. F. Navarra	Mejora de la accesibilidad telefónica del ciudadano (implantación de un Contact Center)	Implantación de un nuevo modelo de relación con la ciudadanía basado en la digitalización y optimización de los servicios, priorizando: la creación de un CRM y Call Center, la puesta a disposición de datos de los Centros de Salud en el portal web, y la gestión de solicitudes y reclamaciones.	GT3. Canal del ciudadano
C. F. Navarra	Puesta en servicio del producto sanitario "in house" NaIA como ayuda a la decisión en casos de Retinopatía Diabética	Dotación a las CCAA de un modelo normalizado y un catálogo común de casos de uso de inteligencia artificial orientados al soporte de la toma de decisiones en el ámbito de la Atención Primaria.	GT7. Soporte a la decisión clínica
País Vasco	Análisis de usabilidad de la Plataforma de Formación Ciudadana de Atención Primaria.	Medición de la experiencia del usuario tras la puesta en producción de la Plataforma de Formación Ciudadana de Atención Primaria.	GT3. Canal del ciudadano



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

**(+) + Estrategia de
Salud Digital**



**Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**
